




تقرير ملخص عن منحة دولة الكويت لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية

وفقاً لإتفاقية المنحة رقم 345 والمعقودة بتاريخ 8/4/2015 بين دولة فلسطين وبين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 200,000,000 دولار أمريكي، والتي تتم إدارتها عن طريق الفريق الوطني لإعادة اعمار المحافظات الجنوبية ويتم تنفيذها من خلال الوزارات ذات العلاقة، كما يتم متابعتها ومراقبتها من قبل استشاري كويتي "العبد الهادي للاستشارات الهندسية".

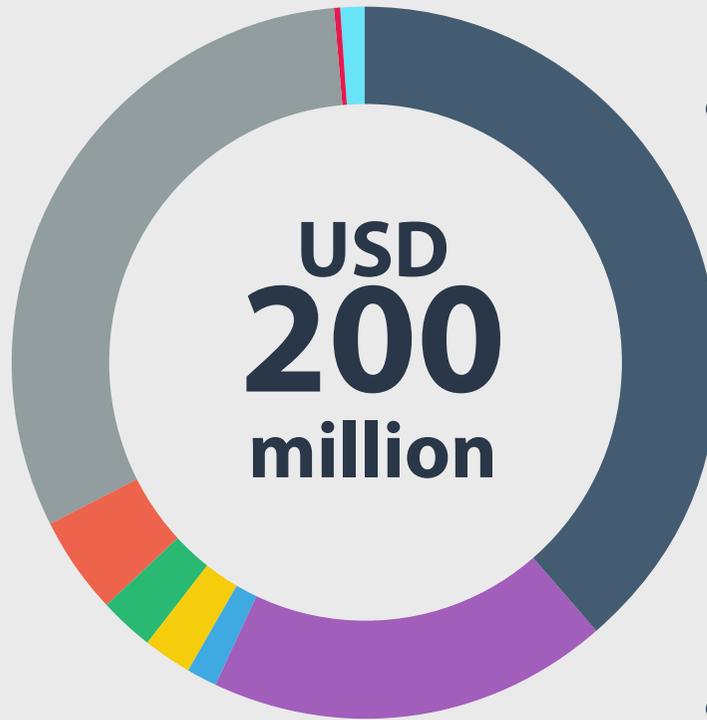

- قطاع الإسكان USD 75 million
- قطاع البنية التحتية USD 35 million
- قطاع التعليم USD 3 million
- قطاع الصحة USD 4 million
- قطاع الزراعة USD 4.9 million
- قطاع الإقتصاد USD 8.6 million
- قطاع المياه USD 60 million
- البناء المؤسساتي USD 0.5 million
- المهام الاستشارية USD 2 million

تم تخصيص مبلغ 75 مليون دولار من المنحة لدعم قطاع الإسكان، وكان من المخطط انجاز 1500 وحدة سكنية ولكننا نجحنا في إعادة بناء عدد 2253 وحدة سكنية مدمرة بالكامل جراء حرب 2014




نسبة
الانجاز

الإسكان
USD 75,000,000



تم الصرف لجميع المستفيدين و تتبقى الدفعة الأخيرة لآخر وحدة سكنية بمبلغ اجمالي 15,120 دولار وجاري الصرف من قبل وزارة المالية.

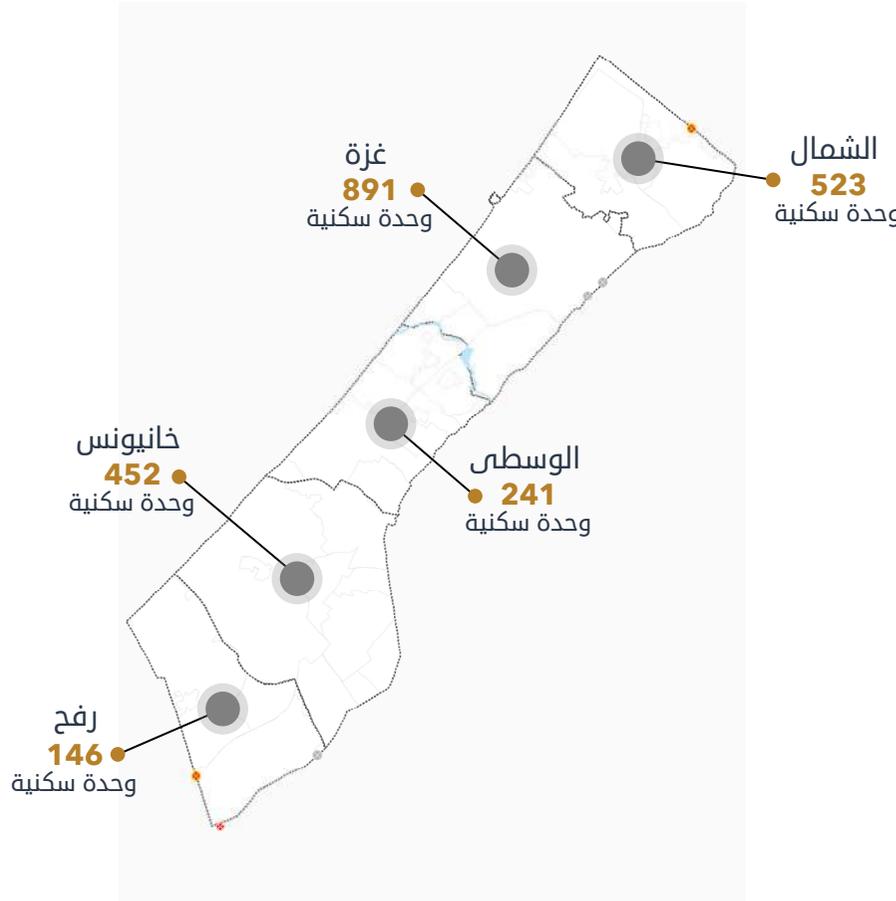

2,253

مجموع الوحدات السكنية
في قطاع غزة
حسب المحافظات

محافظة الشمال



محافظة غزة




محافظة الوسطى





تم تخصيص مبلغ 35 مليون دولار من المنحة لصالح إعادة تأهيل قطاع البنية التحتية في المحافظات الجنوبية، بالإضافة لإنشاء مختبر المواصفات والمقاييس لصالح وزارة الإقتصاد وتركيب طاقة شمسية لوزارة الأشغال العامة والإسكان.



نسبة
الانجاز

البنية التحتية
USD 35,000,000



تم تمويل 53 مشروع في قطاع البنية التحتية على مستوى محافظات قطاع غزة و لجميع البلديات، تم تقسيم المشاريع إلى خمسة عطاءات حسب المحافظات .

الانجاز في العمل

20 مشاريع قيد العمل.

6 مشروع جاري تسليمه.

27 مشروع منتهي بشكل كامل.

- مشروع تزويد مقرات وزارة الأشغال العامة والإسكان بالطاقة الشمسية بمبلغ إجمالي 94,322.31 دولار أمريكي: تم الانتهاء من المشروع وتم استلامه استلاماً نهائياً.
- مشروع مختبر وزارة الإقتصاد بمبلغ إجمالي 515,200.0 دولار أمريكي: تم توقيع العقد مع الشركة المنفذة (شركة أدفانسديتك) بتاريخ 8 أغسطس 2019 وتم اصدار أمر الإحالة ويجري العمل في توريد أجهزة ومعدات لصالح المختبر.

محافظه الشمال إعادة تأهيل 16 مشروع



بلدية بيت لاهيا

- إعادة تأهيل الشارع العام - مركز المدينة
- صيانة وتطوير شوارع فرعية
- انشاء مبنى تجاري للبلدية

جاري العمل

جاري التسليم

تم التسليم



بلدية جباليا

- إعادة تأهيل شارع احمد فكري
- إعادة تأهيل شارع الزاوية ومنطقة عجور
- إعادة تأهيل شارع عمر بن الخطاب

جاري العمل

جاري التسليم

تم التسليم



بلدية بيت حانون

- إعادة تأهيل شارع خليل الوزير
- إعادة تأهيل شارع السلطان عبد الحميد وشارع رقم 41
- إعادة تأهيل شارع البنات وشارع مهدي الشوا
- إعادة تأهيل منطقة عبد الدايم
- صيانة شوارع داخلية
- إعادة تأهيل شارع القرمان
- تأهيل وترميم مباني البلدية المتضررة
- إعادة تأهيل المنطقة الصناعية

جاري العمل

جاري التسليم

تم التسليم



بلدية ام النصر

- صيانة شوارع داخلية
- تأهيل مبنى البلدية

جاري العمل

جاري التسليم

تم التسليم



محافظة غزة إعادة تأهيل 9 مشاريع

1
مشاريع

بلدية الزهراء

- إعادة تأهيل وتطوير شارع رقم 16

جاري العمل

جاري التسليم

تم التسليم

1
مشاريع

بلدية وادي غزة

- صيانة شوارع داخلية

جاري العمل

جاري التسليم

تم التسليم

3
4
مشاريع

بلدية غزة

- إعادة تأهيل وتطوير شارع الشعف
- إعادة تأهيل وتطوير شارع المنصورة
- إعادة تأهيل وتطوير شارع المنطار
- إعادة تأهيل وتطوير الشوارع المؤدية إلى المنطقة الصناعية

جاري العمل

جاري التسليم

تم التسليم

3
مشاريع

بلدية المغرقة

- تأهيل المنطقة الشمالية للمغرقة
- تأهيل وصيانة الشارع الرئيسي
- تأهيل وصيانة شارع السكة

جاري العمل

جاري التسليم

تم التسليم



محافظة الوسطى إعادة تأهيل 8 مشاريع

1
مشاريع

بلدية النصيرات

- صيانة شبكة الطرق الرئيسية الداخلية

تم التسليم جاري التسليم جاري العمل

1
مشاريع

بلدية البريج

- إعادة تأهيل وتطوير شارع النزهة

تم التسليم جاري التسليم جاري العمل

1
مشاريع

بلدية المغازي

- تطوير منطقة بلوك 1

تم التسليم جاري التسليم جاري العمل

1
مشاريع

بلدية وادي السلقا

- إعادة تأهيل وتطوير شارع السطري رقم 18

تم التسليم جاري التسليم جاري العمل

2
مشاريع

بلدية دير البلح

- تأهيل وتطوير شوارع البلدة القديمة
- إعادة تأهيل وتطوير شوارع المنطقة الصناعية

تم التسليم جاري التسليم جاري العمل

1
مشاريع

بلدية الزوايدة

- إعادة تأهيل وتطوير شارع عمر بن عبدالعزيز

تم التسليم جاري التسليم جاري العمل

1
مشاريع

بلدية المصدر

- إعادة تأهيل وتطوير شارع رقم R1

تم التسليم جاري التسليم جاري العمل



محافظه خانيونس إعادة تأهيل 13 مشروع

3
مشاريع

بلدية خزاعة

- إعادة تأهيل وتطوير طرق داخلية متفرقة (بلاط)
- إعادة تأهيل وتطوير طرق اسفلتية بمنطقة أبو ريده
- إعادة تأهيل وتطوير طرق اسفلتية بمنطقة الرضوان

تم التسليم جاري التسليم جاري العمل

1
مشاريع

بلدية القرارة

- صيانة شبكة الطرق الرئيسية الداخلية

تم التسليم جاري التسليم جاري العمل

1
مشاريع

بلدية بني سهيلا

- صيانة شبكة الطرق الرئيسية الداخلية

تم التسليم جاري التسليم جاري العمل

1
مشاريع

بلدية عبسان الكبيرة

- صيانة شبكة الطرق الرئيسية الداخلية

تم التسليم جاري التسليم جاري العمل

5
مشاريع

بلدية خان يونس

- إعادة تأهيل الطرق الرئيسية بخان يونس
- إعادة تأهيل الطرق الفرعية والأرصفة بخان يونس
- إعادة تأهيل وتطوير شارع رقم 3 الشسخ عمري
- إعادة تأهيل وتطوير شارع رقم 66
- المنطقة الصناعية

تم التسليم جاري التسليم جاري العمل

1
مشاريع

بلدية عبسان الجديدة

- صيانة شبكة الطرق الرئيسية الداخلية

تم التسليم جاري التسليم جاري العمل

1
مشاريع

بلدية الفخاري

- صيانة شبكة الطرق الرئيسية الداخلية

تم التسليم جاري التسليم جاري العمل



محافظة رفح إعادة تأهيل 7 مشاريع

1
مشاريع

بلدية النصر

- إعادة تأهيل طرق متضررة

جاري العمل

جاري التسليم

تم التسليم

2
مشاريع

بلدية الشوكة

- إعادة تأهيل طرق رئيسية
- إنشاء مبنى الورشة البلدي

جاري العمل

جاري التسليم

تم التسليم

3
4
مشاريع


بلدية رفح

- اصلاح اضرار طرق رئيسية في مناطق مختلفة من رفح
- اصلاح و اعادة تأهيل شارع مستشفى ابو يوسف النجار
- تأهيل المركز التجاري - مرحلة ثانية
- إنشاء المنطقة الصناعية


جاري العمل

جاري التسليم

تم التسليم

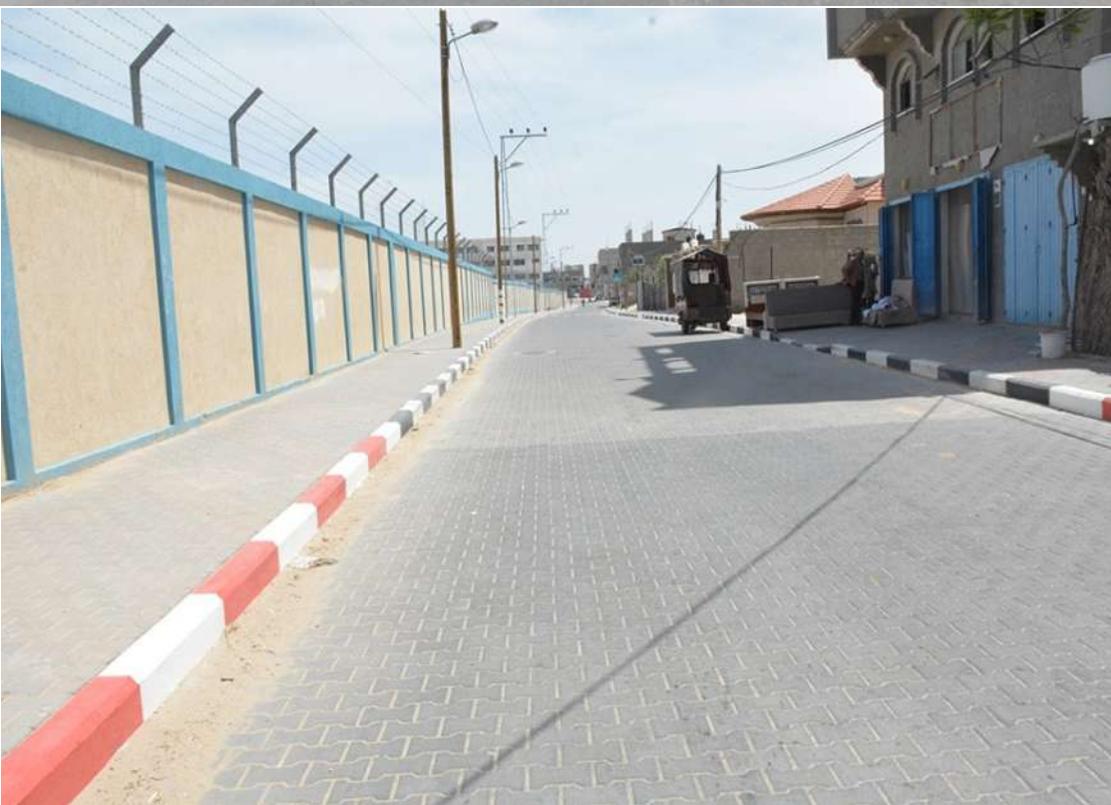

تم تخصيص مبلغ 3 مليون دولار لصالح المؤسسات الأهلية والتعليمية في قطاع غزة.



نسبة
الإنجاز

التعليم
USD 3,000,000



تم من خلال هذا القطاع دعم 13 مؤسسة أهلية تُعنى بالتعليم وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وقد تم الانتهاء من معظم الأعمال المطلوبة للمؤسسات التالية.

الإنجاز	اسم المشروع	المؤسسة المستفيدة
انتهى	تجهيز عيادات في كليتي طب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية	جامعة الأزهر
انتهى	تجهيز مختبرات التعليم الإلكتروني في فروع الجامعة بقطاع غزة	جامعة القدس المفتوحة
انتهى	تجهيز مختبر التبريد والتكييف	كلية فلسطين التقنية
انتهى	تجهيز مختبر لمختبر البيولوجيا الجزيئية	الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا
قيد العمل	تجهيز مختبر التشخيص الوراثي والأمراض السرطانية	جامعة الإسراء بغزة
انتهى	تجهيز مختبرات كلية الهندسة و كلية العلوم الصحية و كلية تكنولوجيا المعلومات	الجامعة الإسلامية
انتهى	تجهيز مختبر المحاكاة للمريض	الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
انتهى	فرش وتجهيز مدرسة شمس الأمل للأطفال ذوي الإعاقة وتركيب مصعد وطاقة شمسية	جمعية المعاقين حركيا

انتهى	تطوير ساحة الألعاب الخارجية وتوريد أثاث ومستلزمات الأنشطة المدرسية وأجهزة طبية	جمعية دير البلح للمعاقين
انتهى	استكمال مركز الرحمة للأيتام للتعليم المهني والتدريب	جمعية الرحمة الخيرية
انتهى	توريد أجهزة ومعدات لمركز التدريب المهني ضمن واستكمال اعمال الطاقة الشمسية	جمعية أطفالنا للصم
انتهى	تطوير مدرسة بسمة النموذجية لذوي الإعاقة -إنشاء مبنى دائم	جمعية إعمار للتنمية والتأهيل
قيد الانتهاء	تدشين المركز الكويتي للتمكين المجتمعي	الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين

تم اعتماد أعمال اضافية لصالح 6 مؤسسات أهليه ممن استفادوا من منحة قطاع التعليم، وتم الانتهاء من 4 في حين جاري العمل لدى 2 منهم.

الإِنجاز	اسم المشروع	المؤسسة المستفيدة
انتهى	مختبر المحاكاة للتمريض للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية	الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
انتهى	مصعد ونظام طاقة شمسية لمشروع مدرسة شمس الأمل للأطفال ذوي الإعاقات الحركية	جمعية المعاقين حركيا
انتهى	توريد أجهزة ومعدات لمركز التدريب المهني	جمعية أطفالنا للصم
قيد العمل	بناء سور وبوابات جديدة ومظلة حديدية وأعمال تليط للساحات الخارجية لمشروع تطوير مدرسة بسمة النموذجية	جمعية إعمار للتنمية والتأهيل
قيد العمل	مختبر التشخيص الوراثي والأمراض السرطانية	جامعة الإسراء بغزة-منحة الاحتياطي
انتهى	دار حماية من التيارات البحرية لساحة الألعاب الخارجية	جمعية دير البلح لتأهيل المعاقين منحة الاحتياطي

يجري حالياً دراسة طلبات أعمال اضافية جديدة لخمسة مؤسسات مستفيدة مما يخدم المشاريع المنجزة ضمن منحة الصندوق الكويتي.




تحت رعاية معالي وزير الاسعاف العامة والإسكان
الدكتور المهندس / محمد محمد زيارة

افتتاح

عيادات في كليتي طب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية

من خلال منحة دولة الكويت لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية - فلسطين


خميس ١٢ سبتمبر/أيلول ٢٠١٩

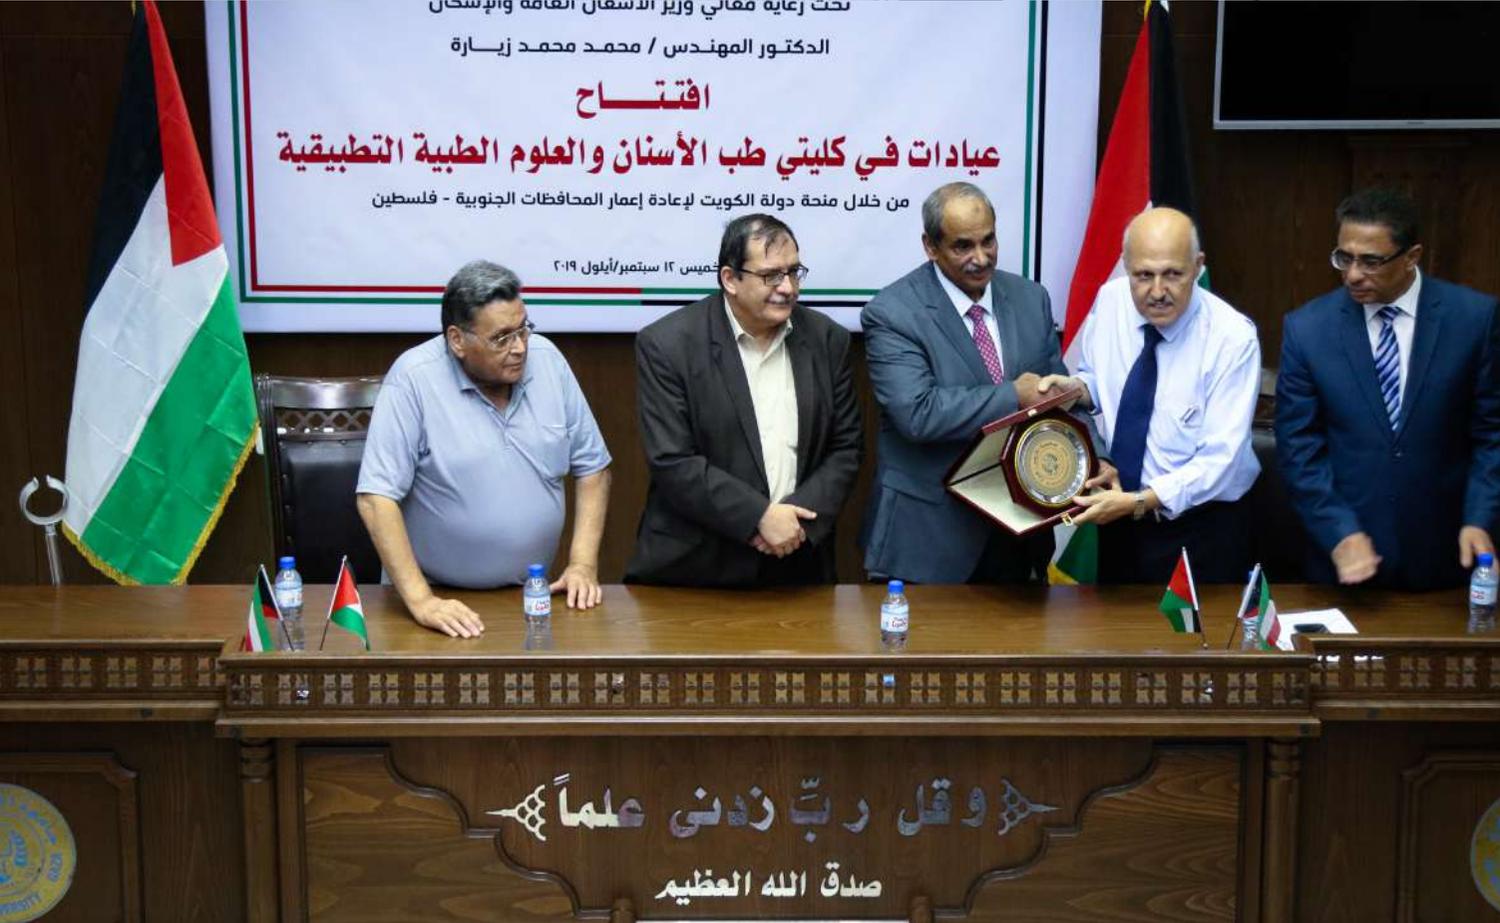

هو قُل رَّبِّ ذُنَىٰ عِلْمًا

صدق الله العظيم

تم تخصيص مبلغ 4 مليون دولار من المنحة لاعادة انشاء مبنى الولادة في مجمع الشفاء الطبي، يتضمن المشروع إزالة مبنى الولادة القديم وإعادة انشاء مبنى جديد مكون من 5 طوابق وبدروم ويحوي عدد اسرة ل 100 سرير.



نسبة
الانجاز

الصحة
USD 4,000,000



تم اختيار قطعة أرض ضمن مجمع الشفاء الطبي، ومباشرة الانشاء، وقد انتهى المقاول من الأعمال الخرسانية بشكل كامل. جاري العمل في أعمال تأسيسات صحية وكهربائية وأعمال التبليط والقصارة الداخلية.



تم تخصيص مبلغ 4.9 مليون دولار ضمن المنحة لدعم قطاع الزراعة، وقد ساهمت المنحة بإعادة بناء وحدات زراعية تمثلت في الآتي:



الزراعة
USD 4,900,000



دفيئات زراعية

تستهدف المنحة إعادة بناء 286 دفيئة زراعية وقد تم الانتهاء بشكل كامل من 119 مستفيد بمبلغ USD 1,290,000 وتبقى 167 مستفيد حصلوا على الدفعة المالية الأولى بمبلغ USD 780,000 ومازال العمل قيد الانشاء لاستلام الدفعة المالية الأخيرة لهم.

حظائر حيوانية


تستهدف المنحة إعادة بناء 533 حظيرة حيوانية وقد تم الانتهاء من البناء بشكل كامل بمبلغ إجمالي 1,249,100 دولار أمريكي.

مختبر الزراعة المركزي

تم الانتهاء من تصميم مبنى المختبر وتجهيز وثائق العطاء تمهيدا لطرحها بعد موافقة الصندوق على وثائق العطاء. وقد تم رصد حوالي USD 800,000 ضمن منحة قطاع الزراعة.



تم تخصيص مبلغ 8.6 مليون دولار ضمن المنحة لدعم قطاع الصناعات الخشبية
والإنشائية وإعادة اعمار المنشآت الصناعية المدمرة وعددها (364 منشأة
صناعية) وفق الأعداد التالية:



نسبة
الانجاز

الاقتصاد
USD 8,600,000



1. منشآت الصناعات الخشبية وعددها 81 منشأة صناعية
2. منشآت الصناعات الإنشائية وعددها 283 منشأة صناعية



تم تخصيص مبلغ 60 مليون دولار لصالح قطاع المياه ضمن منحة الصندوق الكويتي لدعم قطاع المياه، وتعد هذه المنحة النواة الأساسية في دعم قطاع المياه والتي ستفتح مجالاً واسعاً في تطوير قطاع المياه:

بدء العمل

نسبة
الانجاز

المياه
USD 60,000,000



تم تخصيص استشاري إيطالي للإشراف على مشاريع قطاع المياه (Lotti) بمبلغ 1,999,390 دولار أمريكي، وقد باشر الاستشاري عمله واستلم 3 دفعات بإجمالي 293,066.48 دولار أمريكي.

جاري العمل على خط مياه مكروت - الخط الناقل الجنوبي والذي يشمل توريد وتركيب أنابيب بطول إجمالي يبلغ 12.5 كم وإنشاء 4 خزانات بسعة إجمالية قدرها 10500 متر مكعب، بالإضافة لتطوير 6 خزانات موجودة.


جاري تقييم العطاء رقم 2 والخاص بتطوير الخط الناقل الجنوبي والذي يشمل بناء محطة الضخ الرئيسية، وتوريد وتركيب أنابيب حديد بطول 66 كم وقطر 150-1600 مم، وتوريد وتركيب 2 كم من أنابيب التغذية الرئيسية، بناء محطة معززة لتقوية ضخ المياه، بالإضافة إلى بناء 4 خزانات بسعة إجمالية قدرها 29400 متر مكعب.

بدأ العمل في قطاع المياه متأخراً نظراً لباقي القطاعات داخل المنحة، وذلك بسبب تأخر التصميم الهندسية للمشروع.

تم التعاقد مع استشاري خارجي (شركة Lotti) لمتابعة ملف المياه بمبلغ إجمالي قيمته (USD 1,999,390) والتي تم تخصيصها من منحة قطاع المياه.



تم تخصيص مبلغ نصف مليون دولار ضمن المنحة لدعم الوزارات المنفذة للمنحة، وتم توفير البناء المؤسساتي في البنود التالية:




نسبة
الانجاز

البناء المؤسساتي
USD 500,000



1. تم توريد 9 سيارات بمبلغ إجمالي 252,000.0 دولار أمريكي
2. تم توريد وتركيب أثاث وأجهزة مكتبية بمبلغ إجمالي 155,896 دولار أمريكي
3. جاري العمل على توريد وتركيب شبكة الربط اللاسلكي لزوم ربط المديرية بوزارة الأشغال العامة والإسكان بمبلغ إجمالي 95,030 دولار أمريكي وقد تم توقيع العقد بتاريخ 8 أغسطس 2019 مع الشركة الفائزة.

تم تخصيص مبلغ 2 مليون دولار ضمن المنحة لصالح تقديم خدمات استشارية



نسبة
الانجاز

المهام الاستشارية
USD 2,000,000



بلغت قيمة التعاقد مع الاستشاري الكويتي مبلغاً إجمالي (USD 1,383,300) مقابل متابعة وتدقيق كافة القطاعات الخاصة بالمنحة. تم تجديد العقد لمدة 18 شهراً آخرين نظراً لوجود بعض الاعمال غير المنجزة ضمن ملفات المنحة وبلغت قيمة التعاقد (USD 615,310).
